

ТЕХНИК УГСРАЛТЫН АЖЛЫН ДААЛГАВАР

Цамхаг хооронд тоног төхөөрөмж шилжүүлэх

№		Хэмжээ			Хавсралт	Материал
Хаяг:		Завхан Ургамал МХС				
Байршил		48.515598°			94.292272°	
Тоног төхөөрөмж шилжүүлэх	Хуучин цамхагаас буулгах-Антенн, кабель	3Жи сектор-3ш RRU-2ш Splitter 2way-2ш DC box-2ш Жампер кабель 70м-2ш Кабель дарагчууд Дагалдах кабелиуд Газардуулгын кабель			Шинэ МХС цамхаг руу	Шилжүүлэхэд шаардлагатай нэмэлт материалыг гүйцэтгэгч
		DC кабель 25м-2ш			ЖМ агуулахруу	
	Шинэ цамхагт угсрах-Антенн, кабель	3Жи сектор-3ш RRU-2ш Splitter 2way-2ш DC box-2ш Жампер кабель 70м-2ш Кабель дарагчууд Дагалдах кабелиуд Газардуулгын кабель			Хуучин цамхагаас	Гүйцэтгэгч
		DC кабель 40м-2ш			ЖМ агуулахаас	
	WCDMA Антенн	чиглэл: [°]	Антенн төрөл	Жампер, кабель [м]	Одоо байгаа чиглэл ийн дагуу угсрах	Гүйцэтгэгч
	сектор А/1	0	65Degree	70		
	сектор В/2	120		70		
	сектор G/2	240				
Газардуулга	Тоног төхөөрөмжийг газардуулгад холбох	хийх				
Бусад	Ялгах тэмдэглэгээ, хаягжилт хийх	Төхөөрөмж, Кабель, антенн-д ялгах тэмдэглэгээ, хаягжилт хийх.				

1. Сайтын гэрээтэй холбоотой асуудлаар гэрээний менежер Мандахтуяатай 93101161 дугаараар холбогдох
2. Тоног төхөөрөмжтэй холбоотой асуудлаар ТАГ-ын ерөнхий инженер З.Мэндбаяр 98101098 дугаараар холбогдох.
3. Антенн поле суурилуулалт хийж, антенн чиглүүлэхдээ РБХ дарга Гомбосүрэн 98101412 дугаараар холбогдох
4. Цахилгааны холболт эхэлж холбохдоо ЗТХ дарга Буянхишиг 98101188-тай ярьж холболт хийх

ТЕХНИК УГСРАЛТЫН АЖИЛ

1. Антенны угсралт, суурилуулалт

№	Гүйцэтгэхажил	Хэмжээ
1	Сектор антенныг угсарч, полд бэхлэх	3 ш
2	RRU угсарч, полд бэхлэх	2 ш
3	Lighting protection DC box-ыг полд бэхлэх	2 ш
4	Баз станц болон RRU хооронд зориулалтын кабель дарагчийг 3м тутамд хийж OF кабелийг маш нямбай татах	Хийх
5	Антенны feeder jumper-ийг холбож хамгаалалтын материалаар технологийн дагуу ороож бэхлэх	2ш
6	Кабель дарагчийг трэй эсвэл ханан дээгүүр тодорхой зайтайгаар бэхэлж, кабелийн эхлэл төгсгөлийн үзүүрүүд дээр тэмдэглэгээ хийх	Хийх
7	Цамхаг дээрхи төхөөрөмжүүдийг газардуулгад холбох	Хийх


Техникийн даалгавар боловсруулсан:

БХГ ТТХ инженер

Н.Хүрэлтогоо

Хянасан: БХГ ТТХ дарга

О.Одмаа

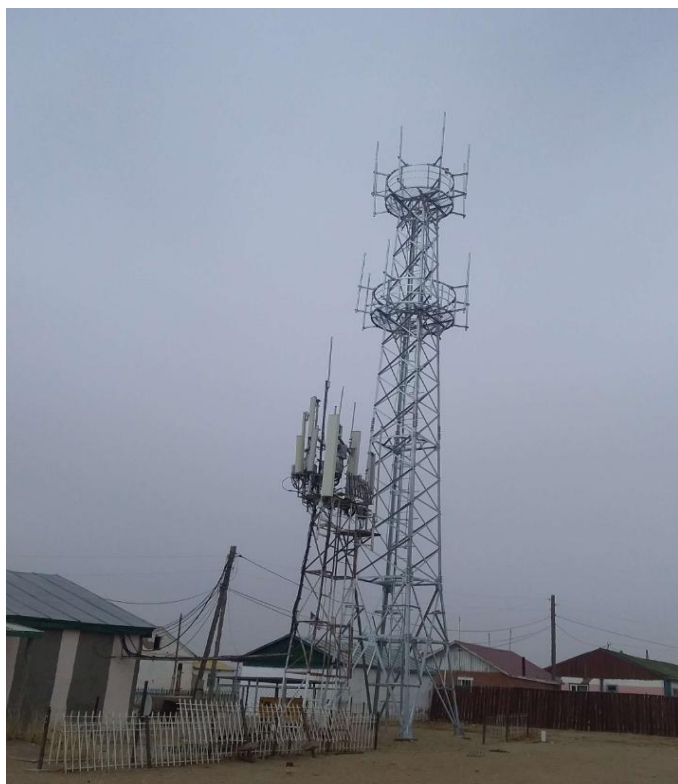

Зураг 1. Шинэ цамхаг
